TALLER INDIVIDUAL

Matriz RACI y Diagrama PERT

Proyecto: Hire-U - Tu camino laboral empieza aquí

1. Matriz RACI

La matriz asigna quién ejecuta, aprueba, consulta y recibe información en cada actividad principal del proyecto Hire-U.

Roles

• **Coordinador del proyecto:** dirige la planificación, controla el alcance y aprueba los entregables.

• **Diseñador UX/UI:** crea la experiencia de usuario y el prototipo de la aplicación.

• **Desarrollador:** implementa los módulos funcionales y realiza la integración técnica.

• **Administrador de base de datos:** diseña y controla la información de perfiles, vacantes y contactos.

• **Universidad y egresados:** aportan requisitos, validan la utilidad y reciben información del avance.

Actividad	Coordinador	Diseñador UX/UI	Desarrollador	Base de datos	Universidad / egresados
Definir la necesidad, alcance y requisitos de Hire-U.	A	C	C	C	R
Diseñar la experiencia, interfaz y prototipo.	A	R	C	I	C
Diseñar el modelo y la estructura de datos.	A	C	C	R	I
Desarrollar los módulos de registro, perfiles, vacantes y contactos.	A	C	R	C	I
Integrar la aplicación con la base de datos.	A	I	R	R	I
Ejecutar pruebas funcionales y validar con usuarios.	A	C	R	C	C
Desplegar, presentar y entregar la solución.	A	C	R	C	I

Convenciones: R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado

2. Diagrama PERT

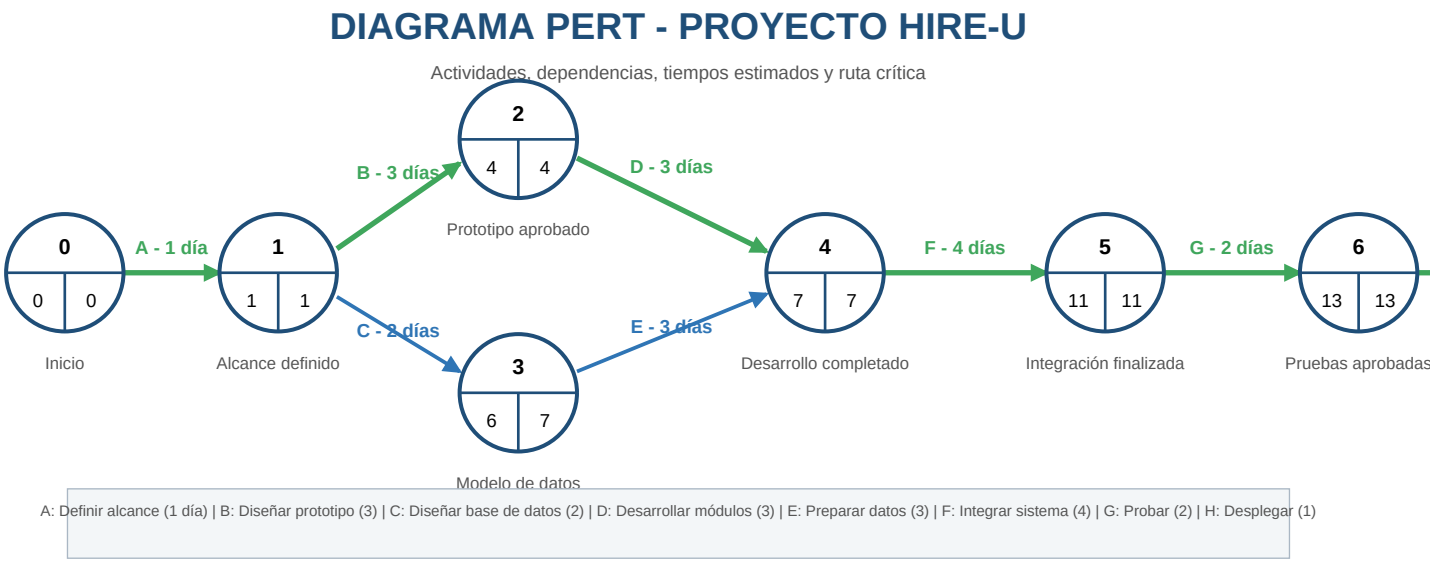

Figura 1. Diagrama PERT del proyecto Hire-U.

Conclusión

La duración estimada del proyecto es de **14 días**. La ruta crítica es **A -> B -> D -> F -> G -> H**. Estas actividades no tienen holgura, por lo que cualquier retraso en ellas modifica la fecha de finalización. La rama **C -> E**, correspondiente al diseño y preparación de la base de datos, dispone de una holgura estimada de **1 día**.
